

RAPPORT D'ÉVALUATION CONFIDENTIEL

Traitement des factures fournisseurs

Dossier d'affaires et plan de mise en œuvre

SCORE D'APTITUDE

74/100

Bon candidat

SCORE DE VALEUR

46/100

rentabilité du projet

ÉCONOMIES NETTES / AN

26 096 \$

après licence et maintenance

STATUT

● Planifier

CATÉGORIE

Finance & comptabilité

PRÉPARÉ POUR

Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)

ÉCHÉANCIER VISÉ

Non précisé

GÉNÉRÉ LE

2026-08-30T20:29:59.059Z

DEVISE

CAD

FIABILITÉ DE L'ÉVALUATION

Moyenne

Sommaire

Ce rapport présente une évaluation structurée de l'aptitude de « Traitement des factures fournisseurs » à l'automatisation, une analyse de rentabilité, une recommandation de priorisation et un plan d'action.

01 Synthèse exécutive
Recommandation, indicateurs clés, points essentiels

02 Diagnostic d'aptitude
Profil par levier, forces et axes d'amélioration

03 Analyse de rentabilité (ROI)
Économies, scénarios, hypothèses

04 Priorisation
Positionnement valeur × aptitude

05 Gouvernance & risques
Registre de risques, RACI, conformité

06 Feuille de route
Plan d'action en 3 phases

07 Annexe
Contexte détaillé et méthodologie

Synthèse exécutive

Planifier : 26 096 \$ d'économies nettes par an, retour sur investissement en 13,8 mois.

RECOMMANDATION GLOBALE

Planifier

Planifier

Basé sur une auto-évaluation individuelle du diagnostic. À faire valider par les autres intervenants du processus avant tout engagement budgétaire.

Fiabilité de l'évaluation : Moyenne. Diagnostic complet (30/30) · Contexte partiel (6/16 champs) · Étapes du processus détaillées · Analyse IA appliquée au contexte · Auto-évaluation par un seul répondant.

Facilité d'adoption prévue : Élevée. Processus standardisé : peu de variations à expliquer aux utilisateurs. · Risque faible : approbation et confiance des utilisateurs plus rapides à obtenir. · Exceptions fréquentes signalées : formation ciblée nécessaire sur les cas limites..

SCORE D'APTITUDE

74/100

Bon candidat

SCORE DE VALEUR (ROI)

46/100

dérivé des hypothèses financières

ÉCONOMIES NETTES / AN

26 096 \$

après licence et maintenance

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

13,8 mois



délai de récupération

Points clés

- Approche d'automatisation recommandée : **Automatisation par règles (RPA)**.
- Point fort principal : Standardisation & stabilité (75/100).
- Le projet génère des économies nettes positives dès l'année 1, avec une valeur actuelle nette sur 5 ans de 74 192 \$.
- **Contraintes réglementaires déclarées (SOX / finance réglementée) : le levier Risque & gouvernance est plafonné à 70/100 malgré une auto-évaluation plus favorable. Vérifiez cette réponse avant de vous engager.**

Le détail de l'analyse et un plan d'action en trois phases sont présentés dans les sections suivantes, notamment la feuille de route (section 05).

Score de 74/100, porté par Standardisation & stabilité (75/100)

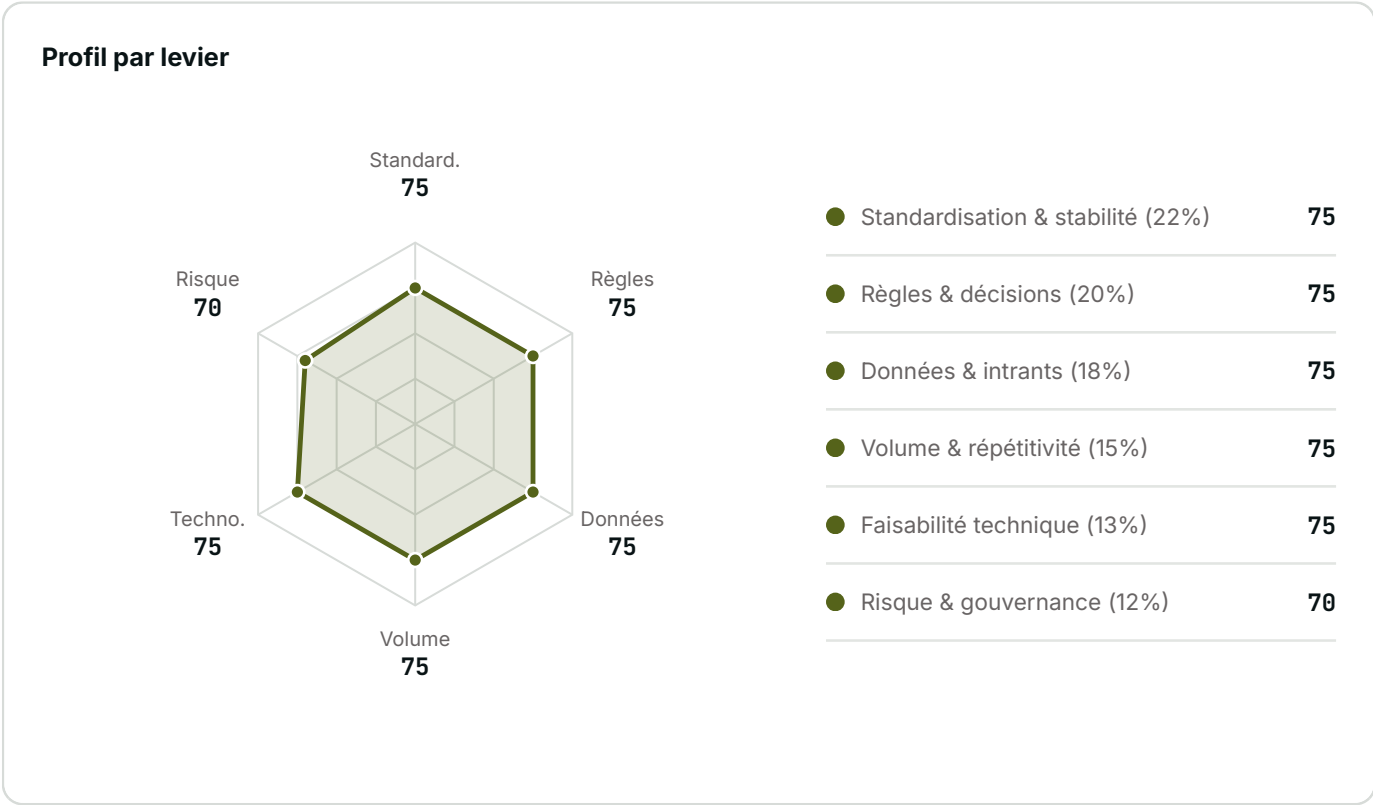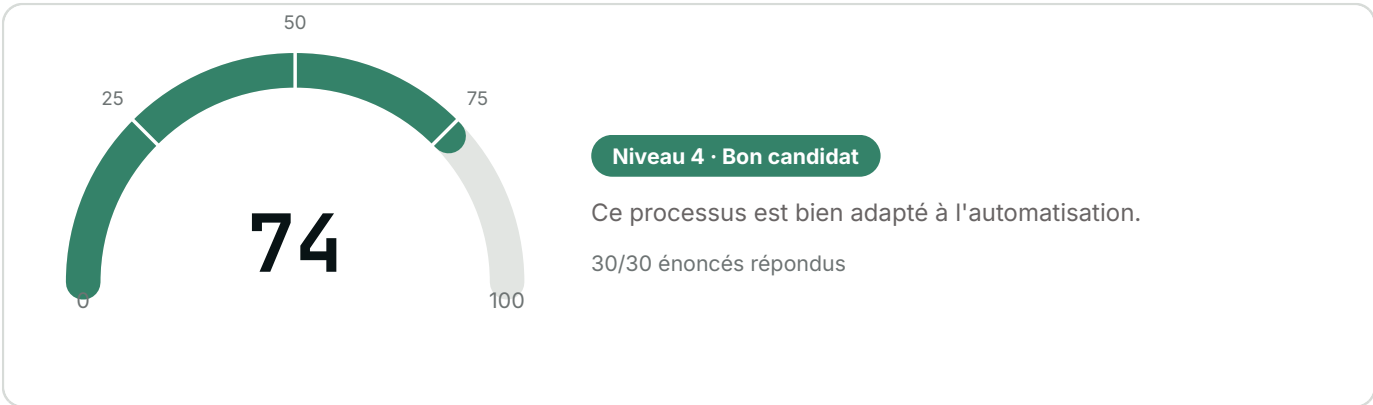

Points forts

● **Standardisation & stabilité · 75/100**

Un déroulement stable et documenté est la base la plus sûre pour un automate fiable : peu de cas imprévus à gérer, peu de maintenance corrective à prévoir.

● **Règles & décisions · 75/100**

Des règles de décision explicites permettent une automatisation directe par moteur de règles, sans dépendre d'un modèle probabiliste pour trancher.

● **Données & intrants · 75/100**

Des intrants numériques et structurés réduisent fortement le risque d'échec technique du projet et accélèrent l'intégration.

● **Volume & répétitivité · 75/100**

Un volume élevé et répétitif maximise le retour sur l'effort d'automatisation : chaque heure investie dans le projet se rentabilise plus vite.

● **Faisabilité technique · 75/100**

Des points d'intégration techniques disponibles réduisent le risque et le coût de mise en œuvre : moins de développement sur mesure à prévoir.

● **Risque & gouvernance · 70/100**

Un risque faible et une gouvernance claire simplifient l'approbation du projet et permettent un déploiement plus large, plus rapidement.

Axes d'amélioration

Aucun frein majeur identifié.

APPROCHE D'AUTOMATISATION RECOMMANDÉE

Automatisation par règles (RPA)

Règles explicites et données structurées : un robot logiciel classique (RPA) ou un moteur de règles suffit, sans avoir besoin d'IA.

- Règles & décisions : 75/100 (décisions explicites).
- Standardisation : 75/100 (déroulement stable).
- Données & intrants : 75/100 (intrants structurés).
- Systèmes mentionnés (SAP, Excel, courriel Outlook) : points d'intégration disponibles, cohérent avec un automate par règles.

POURQUOI CETTE APPROCHE

Cette approche est retenue lorsque les trois leviers Règles & décisions, Standardisation et Données & intrants atteignent chacun au moins 55/100 : le processus suit des règles explicites, un déroulement stable et des données déjà structurées — les conditions classiques d'un automate RPA, sans avoir besoin d'intelligence artificielle. Si le levier Données était descendu sous ce seuil, l'extraction intelligente de documents (IDP) aurait été proposée à sa place ; si c'est plutôt le levier Règles qui était sous le seuil, un agent IA aurait été plus indiqué.

Contraintes réglementaires déclarées (SOX / finance réglementée) : le levier Risque & gouvernance est plafonné à 70/100 malgré une auto-évaluation plus favorable. Vérifiez cette réponse avant de vous engager.

Schéma de flux

Systèmes sources
SAP, Excel, courriel Outlook



Automatisation
Automatisation par règles (RPA)



Résultat
Volume traité automatiquement,
supervision humaine sur les
exceptions.

Étapes documentées

ÉTAPE	QUI	SYSTÈME	MIN.	AUTO.	FRICTION
Réception et tri des factures	Agent AP	Outlook	8	Non	Formats hétérogènes (PDF, papier scanné)
Rapprochement à 3 volets	Agent AP	SAP	12	Oui	-
Approbation et paiement	Superviseur	SAP	6	Oui	Délai d'attente d'approbation

Total : 26 min par occurrence, tel que documenté par l'utilisateur. « Auto. » indique si l'étape suit une règle constante et utilise des données déjà numériques.

Outils déjà en place

Ce que vous possédez déjà, classé selon son rôle possible dans une automatisation. Cette lecture précède volontairement les pistes d'outils : le moteur le moins cher est souvent celui qui est déjà installé et déjà payé.

intégrable

SAP · Outlook / courriel Microsoft

Cet outil n'automatise pas de lui-même, mais il expose des interfaces (API, connecteurs standards) : une plateforme d'automatisation peut y lire et y écrire sans intervention manuelle.

source de données

Excel

Cet outil contient l'information mais n'orchestre rien. Il peut servir de point de départ ou d'arrivée à une automatisation, jamais de moteur — et un fichier partagé reste fragile comme pièce maîtresse d'un processus.

Aucun moteur d'automatisation n'est déclaré, mais 2 de vos outils exposent des interfaces d'intégration : une plateforme légère suffirait probablement à les relier, sans remplacer l'existant.

Pistes d'outils

Microsoft Power Automate

Entrée de gamme, intégré Microsoft 365

Vous avez mentionné Outlook / courriel Microsoft : intégration Microsoft déjà en place, adoption facilitée.

Environnement : Fait partie de la Power Platform de Microsoft (avec Power Apps, Power BI, Dataverse). SaaS cloud natif, licence par utilisateur ou par flux, intégration profonde avec Microsoft 365/Teams/SharePoint/Dynamics — le choix naturel si l'organisation est déjà sur l'environnement Microsoft.

Limites : Nécessite les licences Microsoft 365/Power Platform ; moins robuste que les plateformes RPA dédiées pour les scénarios complexes multi-systèmes ou les gros volumes.

UiPath

Milieu à haut de gamme, écosystème mature

Vous avez mentionné SAP : pensé pour les intégrations à grande échelle.

Environnement : Plateforme RPA indépendante (pas liée à un fournisseur cloud en particulier), déployable sur site ou en cloud. Vaste place de marché de connecteurs (SAP, Salesforce, systèmes legacy), communauté et bassin de talent formé les plus larges du marché RPA.

Limites : Coût de licence significatif à l'échelle ; courbe d'apprentissage plus longue pour une équipe interne, souvent un intégrateur requis au démarrage.

Automation Anywhere

Haut de gamme, orienté grande entreprise

Vous avez mentionné SAP : pensé pour les intégrations à grande échelle.

Environnement : Plateforme cloud-native (Automation 360), pensée pour une gouvernance centralisée à l'échelle de centaines de robots. Marketplace de bots préconstruits ; souvent choisie par des directions TI qui déploient à très grande échelle dès le départ.

Limites : Tarification et déploiement pensés pour la grande entreprise ; généralement surdimensionné pour un premier robot ou un faible volume.

Sélection indicative et non exhaustive, à valider selon vos besoins, contraintes d'achat et intégrations existantes ; pas une recommandation d'achat. VerdiktNow ne touche aucune commission ni aucun avantage de ces fournisseurs.

Questions à poser à un prestataire

- ☐ Qui, chez eux, sera responsable du support après la mise en production, et pendant combien de temps ?
- ☐ Que se passe-t-il si vous changez de fournisseur : les automatisations développées sont-elles portables ?
- ☐ Quel est le coût réel après implémentation (licences, maintenance, support), pas seulement le prix d'entrée ?
- ☐ Ont-ils déjà automatisé un processus similaire (même secteur, mêmes systèmes) ? Demandez une référence vérifiable.
- ☐ Qui assure la maintenance une fois le robot en production : eux, votre équipe interne, ou les deux ?
- ☐ Quel est le délai de correction garanti en cas de panne du robot (SLA) ?

Apportez cette page à votre première rencontre avec un fournisseur ou un consultant : elle résume ce qu'il doit savoir pour vous faire une proposition pertinente, sans qu'il ait à redécouvrir le contexte du processus.

26 096 \$ d'économies nettes par an, retour en 13,8 mois

ÉCONOMIES NETTES RÉCURRENTES / AN

26 096 \$

RETOUR SUR INVEST.

13,8 mois

VAN · 5 ANS

74 192 \$

HEURES / AN

1 564 h

ETP LIBÉRÉS

0,98

COÛT ACTUEL DU PROCESSUS


93 845 \$

SCORE DE VALEUR

46/100

Décomposition du coût actuel : 88 200 \$ de traitement normal + 5 645 \$ de reprise sur erreur (8% d'erreurs).


Pont de valeur (value bridge)

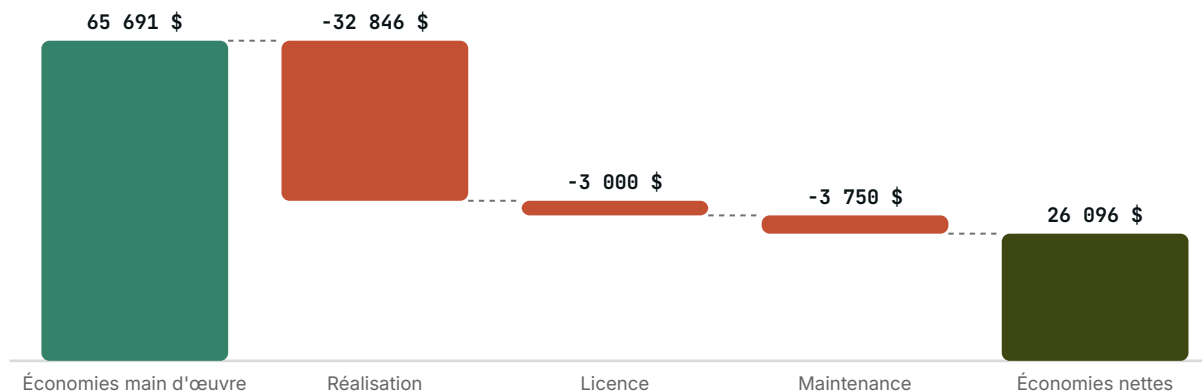

Des économies de main d'œuvre brutes, on retranche la licence et la maintenance pour arriver aux économies nettes récurrentes.

Trésorerie cumulée · 60 mois

— Automatiser — Coût de l'inaction (statu quo)




0 à 60 mois · seuil de récupération ≈ 13,8 mois. Écart estimé sur 5 ans entre automatiser et ne rien faire : 569 702 \$.

Fourchette de scénarios

PRUDENT	PROBABLE	OPTIMISTE
16 242 \$	26 096 \$	32 665 \$

Les scénarios font varier le taux d'automatisation réalisable ($\pm 30\%$), l'hypothèse la plus incertaine du modèle, toutes autres variables étant maintenues constantes.

Analyse de sensibilité

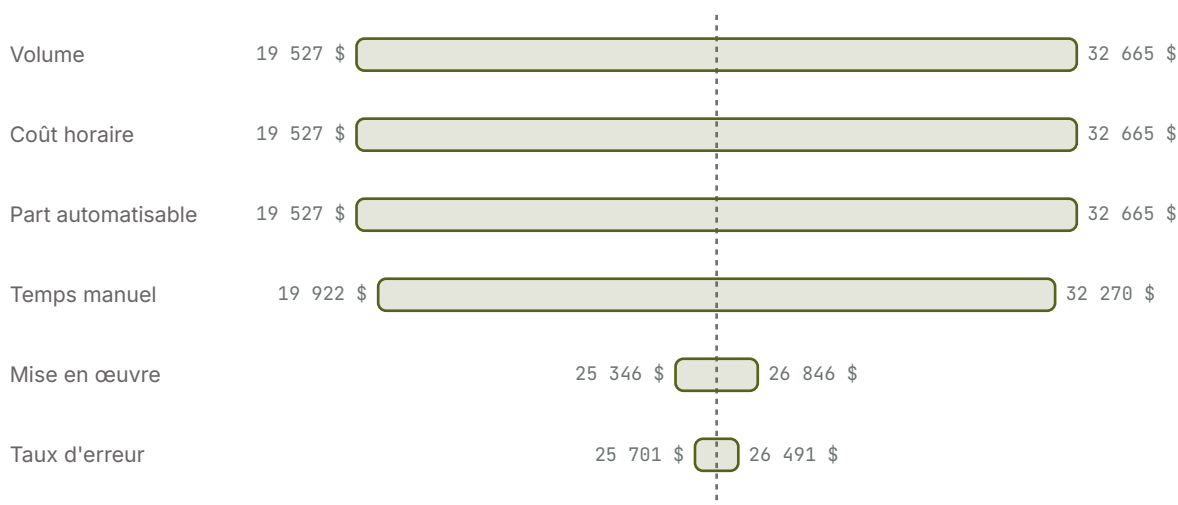

Chaque barre fait varier une seule hypothèse de $\pm 20\%$, les autres restant constantes, autour des économies nettes actuelles (ligne pointillée : 26 096 \$). Trié par ordre d'impact : l'hypothèse en haut est celle à valider en priorité avant de vous engager.

Hypothèses

Volume / mois 420	Temps manuel / occ. 25 min	Coût horaire chargé 42 \$
Taux d'erreur 8 %	Reprise / erreur 20 min	Part automatisable 70 %
Mise en œuvre 25 000 \$	Licence / an 3 000 \$	Maintenance annuelle 15 %
Conduite du changement 5 000 \$	Taux d'actualisation 8 %	


Planifier : positionnement valeur x aptitude

RECOMMANDATION

Planifier

Planifier

Matrice Valeur x Aptitude

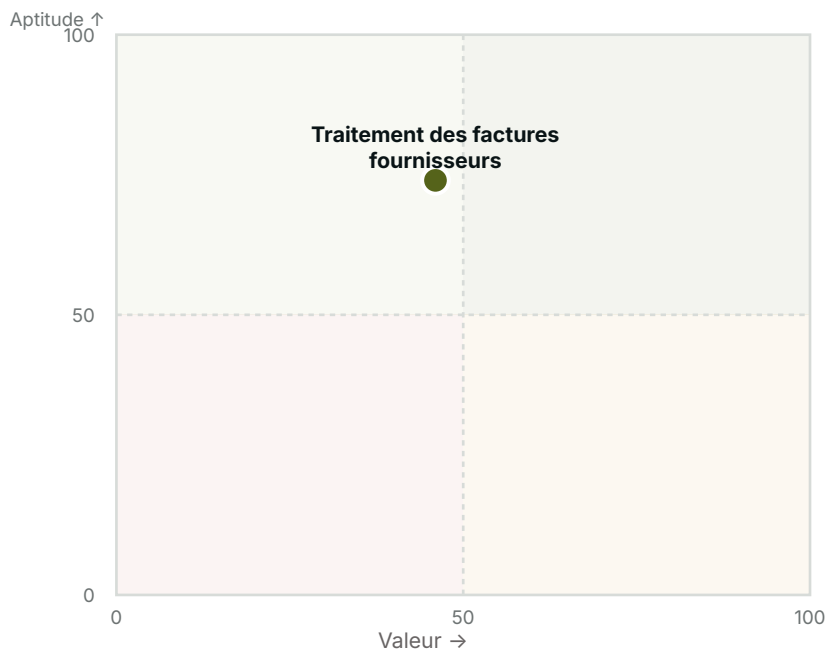

APTITUDE

74/100

VALEUR

46/100

ÉCONOMIES NETTES / AN

26 096 \$

Les 4 quadrants

Automatiser en priorité

Forte valeur et bonne aptitude : c'est un gain rapide. Ce processus devrait figurer en tête de votre feuille de route.

Préparer le terrain

Valeur attrayante mais aptitude insuffisante : investissez d'abord dans la préparation (données, règles, standardisation) avant d'automatiser.

Planifier

Aptitude élevée mais valeur plus modeste : automatisable sans difficulté, à programmer quand la capacité le permet.

Écarter pour l'instant

Valeur et aptitude faibles : l'automatisation n'est pas justifiée en l'état. Réévaluez après amélioration du processus.

1 risque prioritaire à traiter avant mise en œuvre

Registre de risques, répartition des responsabilités et points de conformité dérivés du diagnostic et du contexte fourni, à valider et enrichir avec vos équipes avant tout engagement.

Registre de risques

RISQUE & MITIGATION	PROBABILITÉ	IMPACT	PROPRIÉTAIRE
Contraintes réglementaires déclarées (SOX / finance réglementée) : le levier Risque & gouvernance est plafonné à 70/100 malgré une auto-évaluation plus favorable. Vérifiez cette réponse avant de vous engager. Impliquer la conformité et prévoir une supervision humaine renforcée avant un déploiement large.	Élevée	Élevée	Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)

Probabilité et impact sont des heuristiques dérivées du diagnostic, pas une évaluation actuarielle. Trié par priorité décroissante.

Matrice RACI

ACTIVITÉ	R	A	C	I
Cadrage & validation du périmètre	Agent AP, Superviseur, Direction des finances	Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)	Équipe TI / développeur automatisé	Direction / comité de pilotage
Développement / configuration	Équipe TI / développeur automatisé	Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)	Agent AP, Superviseur, Direction des finances	Direction / comité de pilotage
Tests & validation	Équipe TI / développeur automatisé	Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)	Agent AP, Superviseur, Direction des finances	Direction / comité de pilotage
Déploiement & mise en production	Équipe TI / développeur automatisé	Agent AP, Superviseur, Direction des finances	Équipe TI / développeur automatisé	Direction / comité de pilotage
Supervision & maintenance continue	Équipe TI / développeur automatisé	Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs)	Conformité / sécurité	Direction / comité de pilotage

R = Responsable (exécute) · A = Approuveur (rend des comptes) · C = Consulté · I = Informé.

Checklist de conformité

- ☐ Confirmer la classification de sensibilité des données traitées (personnelles, financières, santé).
- ☐ Valider la conservation et la localisation des données (résidence, sous-traitants).
- ☐ Vérifier l'obligation d'un registre de traitement ou d'une analyse d'impact (EFVP/DPIA) si des données personnelles sont concernées.
- ☐ Vérifier les exigences de piste d'audit et de conservation réglementaire (normes comptables, fiscalité).
- ☐ Impliquer l'audit interne : un contrôle SOX peut exiger une piste d'audit spécifique sur les étapes automatisées.

Liste indicative, à valider avec vos équipes juridique et conformité selon votre secteur et votre juridiction.

Sécurité opérationnelle


- ☐ Restreindre les accès de l'automatisation au strict périmètre nécessaire (principe du moindre privilège).
- ☐ Définir qui peut modifier ou désactiver l'automatisation, et comment cet accès est révoqué (départ, changement de rôle).
- ☐ S'assurer que les actions de l'automatisation sont journalisées et traçables (qui/quoi/quand).
- ☐ Vérifier les certifications de sécurité du ou des fournisseurs (ex. SOC 2, ISO 27001) si des données sensibles transitent chez eux.
- ☐ Séparer les environnements de test et de production pour éviter qu'un essai n'affecte des données réelles.
- ☐ Utiliser un compte de service dédié pour les actions du robot, jamais les identifiants personnels d'un employé.

Complète la checklist de conformité ci-dessus (réglementaire) par des bonnes pratiques de sécurité opérationnelle des accès et des données de l'automatisation elle-même.

Plan d'action en 3 phases, 3 étapes immédiates

Plan d'action en trois phases, dérivé du profil de leviers, de l'approche recommandée et des hypothèses financières ci-dessus. À ajuster avec les parties prenantes lors du cadrage.

Aperçu du calendrier

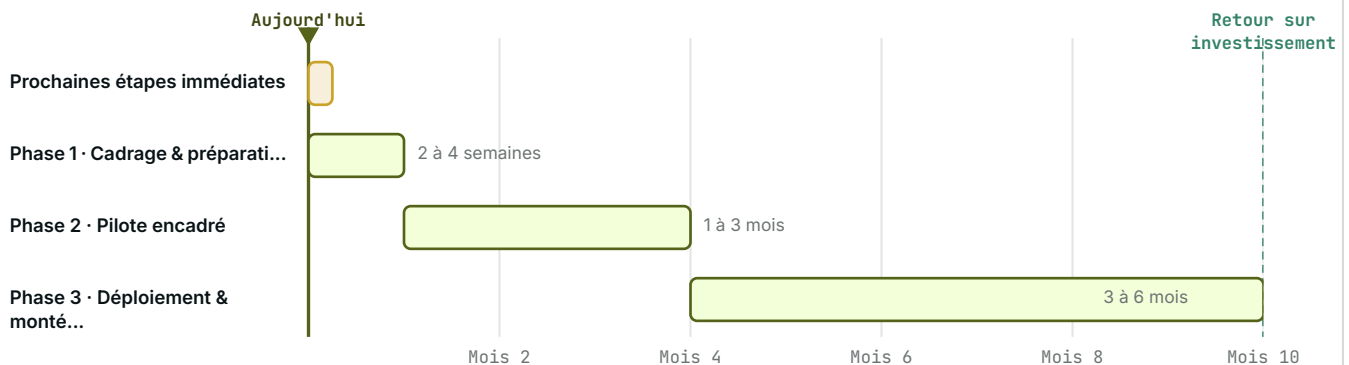

Estimation indicative à partir de la date de génération de ce rapport, pas un engagement de calendrier.

PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

- ☐ Partager ce rapport avec Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs) et confirmer le go / no-go de la phase de cadrage.
- ☐ Bloquer une plage de 2 semaines pour le cadrage détaillé du pilote.
- ☐ Fixer un échéancier cible pour le pilote (typiquement 4 à 8 semaines après le cadrage).

Phase 1 · Cadrage & préparation

2 à 4 semaines

- Confirmer Julie Bergeron (Directrice des comptes fournisseurs) comme porteur du projet et point de contact gouvernance.
- Valider le périmètre exact du processus avec les parties prenantes identifiées (Agent AP, Superviseur, Direction des finances).
- Définir un plan de sortie avant de commencer : à quel signal interromprait-on le pilote, et comment reprendre le processus manuel si nécessaire ?
- Évaluer l'impact humain sur les personnes qui exécutent ce processus aujourd'hui (Agent AP, Superviseur, Direction des finances) : quelles tâches changent, et comment accompagner la transition (redéploiement, formation, communication).
- Valider les points d'intégration disponibles pour les systèmes mentionnés : SAP, Excel, courriel Outlook.
- Aucun levier critique identifié : le processus est prêt à passer directement au pilote.
- Prendre contact avec un ou plusieurs fournisseurs de solutions d'automatisation pour explorer les options disponibles et obtenir une démonstration.
- Sélectionner le fournisseur retenu et formaliser l'entente : portée, coûts, échéancier et conditions contractuelles.

Phase 2 · Pilote encadré

1 à 3 mois

- Organiser le lancement du pilote avec le fournisseur retenu : réunion de démarrage, accès aux systèmes et environnement de test.
- Développer un robot logiciel (RPA) ou un moteur de règles sur un sous-ensemble représentatif du volume.
- Cibler en priorité la réduction des irritants déclarés : Ressaisie manuelle des données, délais d'approbation de plusieurs jours.
- Documenter la gestion des cas particuliers pendant le pilote, avant automatisation complète : Facture sans bon de commande : validée manuellement par le superviseur.
- Prévoir une supervision humaine sur l'ensemble des cas traités pendant le pilote, avec revue hebdomadaire des écarts.
- Faire le bilan du pilote avec le fournisseur et les parties prenantes, puis statuer sur le go / no-go du déploiement complet.

Phase 3 · Déploiement & montée en charge

3 à 6 mois

- Mettre en production le déploiement complet, avec le soutien du fournisseur si nécessaire.
- Étendre progressivement l'automatisation à l'ensemble du volume, par vagues, en surveillant le taux d'erreur et le temps de traitement.
- Mettre à jour la documentation et former les équipes concernées aux nouveaux points de contrôle.
- Désigner qui opère et maintient l'automate en continu : centre d'excellence dédié ou équipe métier existante, avec un point de contact clair pour les incidents.
- Suivre les économies nettes réalisées par rapport à la cible (26 096 \$/an) et ajuster les hypothèses si nécessaire.
- Réévaluer ce processus dans VerdiktNow après le déploiement pour documenter l'évolution de l'aptitude et des gains.

Annexe

Contexte du processus

NOM DU PORTEUR DE PROJET
Julie Bergeron

TITRE ET DIRECTION DU PORTEUR
Directrice des comptes fournisseurs

INTERVENANTS ET RÔLES
Agent AP, Superviseur, Direction des finances

SYSTÈMES ET APPLICATIONS UTILISÉS
SAP, Excel, courriel Outlook

IRRITANTS ET POINTS DE DOULEUR ACTUELS
Ressaisie manuelle des données, délais d'approbation de plusieurs jours

EXCEPTIONS ET CAS PARTICULIERS FRÉQUENTS
Facture sans bon de commande : validée manuellement par le superviseur

Réponses détaillées du diagnostic

Standardisation & stabilité · 75/100

Ce processus est documenté et suit un déroulement stable.	3/4 · En grande partie
Les étapes sont exécutées de façon homogène d'une fois à l'autre.	3/4 · En grande partie
Les exceptions sont rares ou clairement balisées.	3/4 · En grande partie
Le processus évolue peu dans le temps (faible volatilité).	3/4 · En grande partie
Tous les intervenants suivent la même procédure.	3/4 · En grande partie

Règles & décisions · 75/100

Les décisions reposent sur des règles explicites, pas sur du jugement.	3/4 · En grande partie
Les cas de figure possibles sont connus et en nombre fini.	3/4 · En grande partie
Peu d'interventions humaines discrétionnaires sont requises.	3/4 · En grande partie
Les critères de validation sont formalisés.	3/4 · En grande partie
Les enchaînements de décision sont reproductibles.	3/4 · En grande partie

Données & intrants · 75/100

Les intrants du processus sont numériques (non papier).	3/4 · En grande partie
Les données nécessaires sont accessibles au bon moment.	3/4 · En grande partie
Les intrants sont structurés et normalisés.	3/4 · En grande partie
La qualité des données en entrée est fiable.	3/4 · En grande partie
Peu de ressaisie manuelle est nécessaire.	3/4 · En grande partie

Volume & répétitivité · 75/100

Le processus se répète fréquemment.	3/4 · En grande partie
Le volume traité est élevé.	3/4 · En grande partie
Le temps cumulé consacré à ce processus est important.	3/4 · En grande partie
Les tâches sont répétitives et prévisibles.	3/4 · En grande partie
Les pics de charge sont récurrents.	3/4 · En grande partie

Faisabilité technique · 75/100

Les systèmes impliqués offrent des points d'intégration (API, connecteurs).	3/4 · En grande partie
Aucun blocage technique majeur n'est anticipé.	3/4 · En grande partie
La sécurité et la conformité permettent l'automatisation.	3/4 · En grande partie
Les outils requis sont disponibles ou accessibles.	3/4 · En grande partie
Une équipe ou un fournisseur capable de déployer l'automatisation est déjà identifié.	3/4 · En grande partie

Risque & gouvernance · 70/100

Les données traitées ne sont pas hautement sensibles ou réglementées (RGPD, santé, finances critiques).	3/4 · En grande partie
L'automatisation de ce processus ne requiert pas d'approbation réglementaire ou d'audit spécifique.	3/4 · En grande partie
Les conséquences d'une erreur automatisée sont limitées et récupérables.	3/4 · En grande partie
Les parties prenantes (métier, TI, conformité) sont favorables à l'automatisation de ce processus.	3/4 · En grande partie
Il existe une gouvernance ou un point de contact clair pour superviser l'automate.	3/4 · En grande partie

Sources et hypothèses

Le score d'aptitude agrège 6 leviers (standardisation, règles & décisions, données & intrants, volume & répétitivité, faisabilité technique, risque & gouvernance), chacun évalué par 5 énoncés pondérés notés de 0 à 4. Le score global est la moyenne pondérée des leviers répondus.

L'approche d'automatisation recommandée (RPA, extraction intelligente de documents, agent IA ou approche hybride) est déterminée à partir de la forme du profil de leviers, et non de la seule moyenne globale : deux processus au même score peuvent appeler des approches différentes.

Le score de valeur (ROI) combine le délai de récupération et l'ampleur des économies nettes récurrentes, après déduction des coûts de licence et de maintenance. Les scénarios prudent / probable / optimiste font varier le taux d'automatisation réalisable, l'hypothèse jugée la plus incertaine.

AJUSTEMENTS APPLIQUÉS PAR LE CONTEXTE

Risque & gouvernance : 75/100 auto-évalué, plafonné à 70/100

Contraintes réglementaires déclarées (SOX / finance réglementée)

HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (ROI)

Volume / mois	Temps manuel / occ.	Coût horaire chargé
420	25 min	42 \$
Taux d'erreur	Reprise / erreur	Part automatisable
8 %	20 min	70 %
Mise en œuvre	Licence / an	Maintenance annuelle
25 000 \$	3 000 \$	15 %
Conduite du changement	Taux d'actualisation	
5 000 \$	8 %	

Avis de confidentialité : ce document peut contenir des informations propres au processus évalué. Il est destiné à un usage interne et ne doit pas être diffusé sans l'accord du commanditaire du projet. Les projections financières sont fournies à titre indicatif et reposent entièrement sur les hypothèses déclarées par l'utilisateur ; elles ne constituent pas une garantie de résultat.
